


# 現場最前線 ～工事現場レポート2～

＜焼津市上小杉に建つ家＞ (2人の住まい+4人の住まい) 敷地 160.57坪

～平屋建て 在来軸組工法 延床面積 28.39坪 延施工面積 29.48坪 御両親の住まい～

11月末に地鎮祭、12月17日に上棟を行いました。11月は雨が多く心配をしていましたが、12月に入り天候の日が続いたので順調に基礎工事、上棟へと進みました。今月末には外廻りの工事が終了予定で、その後は内部の木工事へと入っていきます。

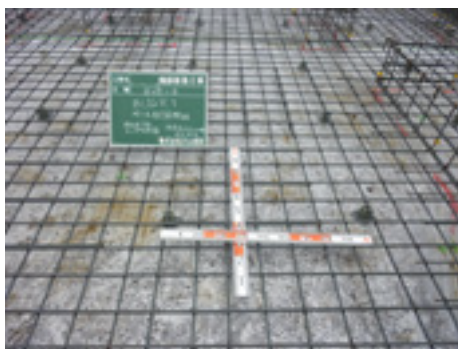

べた基礎の鉄筋工事



基礎工事完成



床組



平屋建ての上棟時の様子



筋交の様子



外断熱工法で遮熱材を施工した様子

～2階建て 在来軸組工法 延床面積 32.01坪 延施工面積 35.16坪～  
＜若夫婦の子育て住まい＞

ご両親の基礎工事完了後に基礎工事にかかりました。建坪が同じ位だと総2階建ての基礎は建つ前は少し小さく見えて、これで建坪の坪数があるのかと感じます。

昨年12月26日に上棟を行いました。午前中は少し風があり、2階建てなので屋根の小屋組を組上げるのに心配しましたが、午後になると風がなくなり順調に上棟できました。

現場の方は昨年は29日まで仕事を進め、屋根の防水のためのアスファルトルーフィングを施工後、洋形瓦を屋根に上げて終了しました。今年は外壁下地の面材の施工から始めて、ベランダの下地、防水工事へと進んでいきます。



基礎工事を上から見た様子



上棟



床断熱材施工後



2階遮熱材の様子



内部の様子



外観
